高雄榮民總醫院

新陳代謝科診療室消毒除黴完工報告

施工日期：2019/11/09

優尼克生技股份有限公司

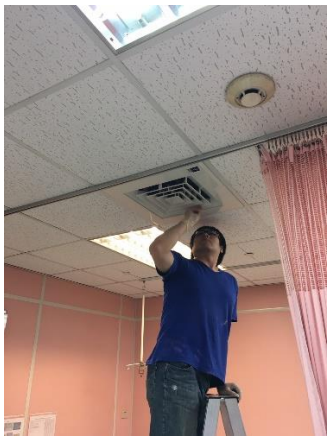
高雄市新興區民生一路 56 號 22 樓之 1

TEL：+86-7-222-5711　FAX：+86-7-222-5719

中　華　民　國　一　〇　八　年　十　一　月　十　二　日

一、 實施說明與照片

(一)、消毒前與後的採樣點

		
木頭櫃子	布簾軌道	冷氣出風口 1
		
冷氣出風口 2	燈罩	菌樣試管

(二)、施工

		
電動床包覆 1	電動床包覆 2	電腦器材包覆

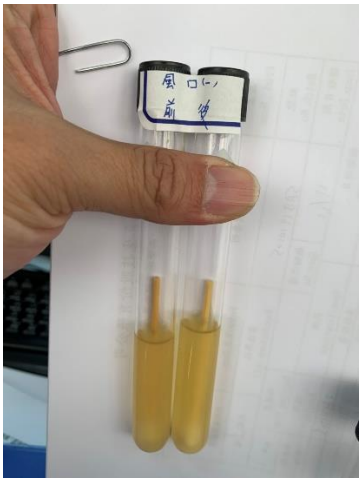
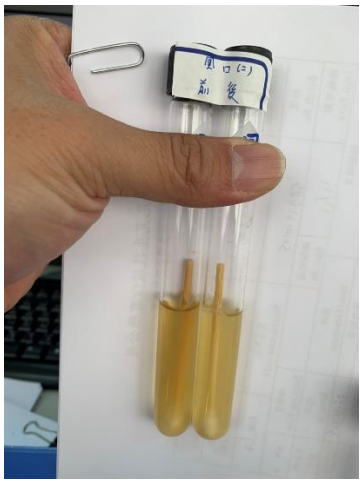
		
第一點釋放二氧化氯	室內釋放二氧化氯氣體	第二點釋放二氧化氯
		
第三點釋放二氧化氯	第四點釋放二氧化氯	第五點釋放二氧化氯
		
木櫃擦拭消毒	置物架擦拭消毒	輕鋼架及軌道擦拭消毒
		
置物架木板擦拭消毒	大門擦拭消毒	大門門框擦拭消毒

以養生膠帶將施工區域內之電子設施做隔離。以本公司專利處理流程將 UC 氣態二氧化氯噴灑於細菌、真菌孳生及可能污染處，進行殺滅作業，噴灑 120 分鐘濃度達到後，進行 30 分鐘靜置反應，然後排氣換氣作業。

對消毒區之設施進行細部擦拭，其目的為去除已殺滅之黴菌及 殘存黴菌孢子，以避免復發與污染。

最後離場作業，將污染物密封，環境清潔確認，用具撤出，拆除隔離設施。

二、 消毒前後試管照片比對(採樣 48 小時後比對)

		
木櫃	布簾軌道	出風口 1
		
出風口 2	燈具	鐵櫃

三、 結論

採樣試管消毒前後都未出現黴菌，但是消毒前試管溶液明顯混濁，消毒後溶液比較清澈，表示達成殺菌效果。

四、 保固條件與時間

該區域24小時的溫濕度應控制在溫度20～24℃，濕度50～60%，以降低黴菌感染及生長機率。

在符合溫溼度條件下，本次消毒作業針對黴菌抑制能力給予保固兩年，若環境條件無法符合，則不給予保固。

保固日期自施作日 2019 年 11 月 9 日起至 2021 年 11 月 8 日止。
